

작업공정사진철

고객명:

공사명: SPINDLE MOTOR OVERHAUL 2대

규격: AC SERVO ∞20 & ∞30

REPAIR 내역: 분해 및 불순물 CLEANSING DRYING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
양 측 HOUSING BUSHING 삽입
냉각 FAN MOTOR BRARING교환
BEARING교환
입 출고검사 시운전 TEST



<http://jinyangmotor.com/>



JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO MOTOR 입고검사



Ass'y

분해 전





작업공정

AC SERVO MOTOR 입고검사



Ass'y

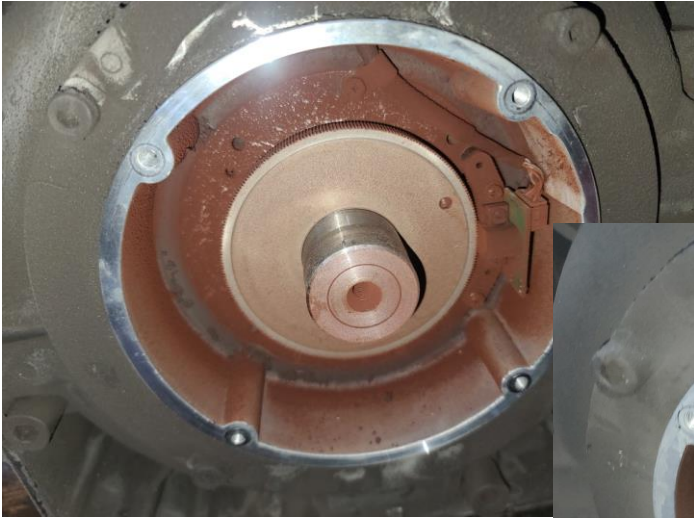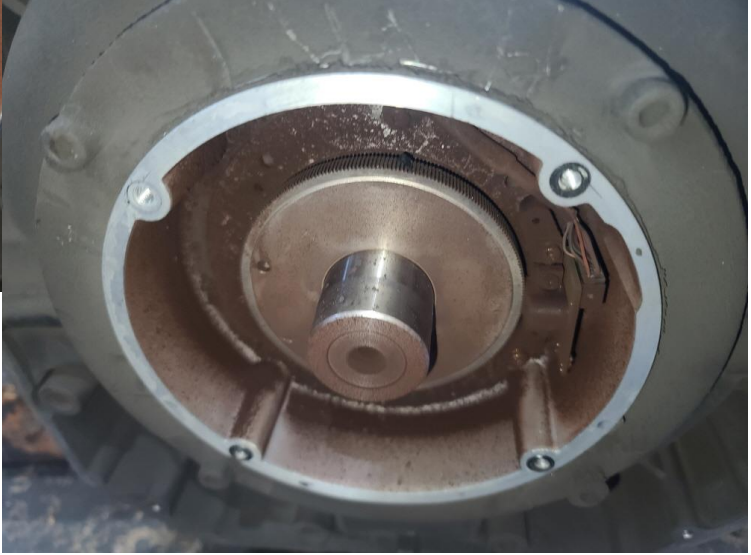분해 실시 냉각구 불순물 고착

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC SERVO MOTOR 입고검사
 <p data-bbox="137 824 197 857">∞ 30</p>	 <p data-bbox="1166 472 1230 506">∞ 40</p>
반 부하 측	분해 실시 HOUSING 마모로 이상
작업공정	AC SERVO MOTOR 입고검사
	
∞ 40 부하 측	HOUSING검사 7/100으로 불량

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO MOTOR 입고검사



∞ 40 반 부하 측

HOUSING검사 7/100으로 불량

작업공정

AC SERVO MOTOR 입고검사



∞ 30 부하 측

HOUSING검사 6/100으로 불량

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO MOTOR 입고검사



∞30 반 부하측

HOUSING검사 22/100으로 불량

작업공정

AC SERVO MOTOR OVERHAUL



STATOR 권체

세척 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO MOTOR OVERHAUL




STATOR 권체

세척 후 건조 실시

작업공정

AC SERVO MOTOR OVERHAUL

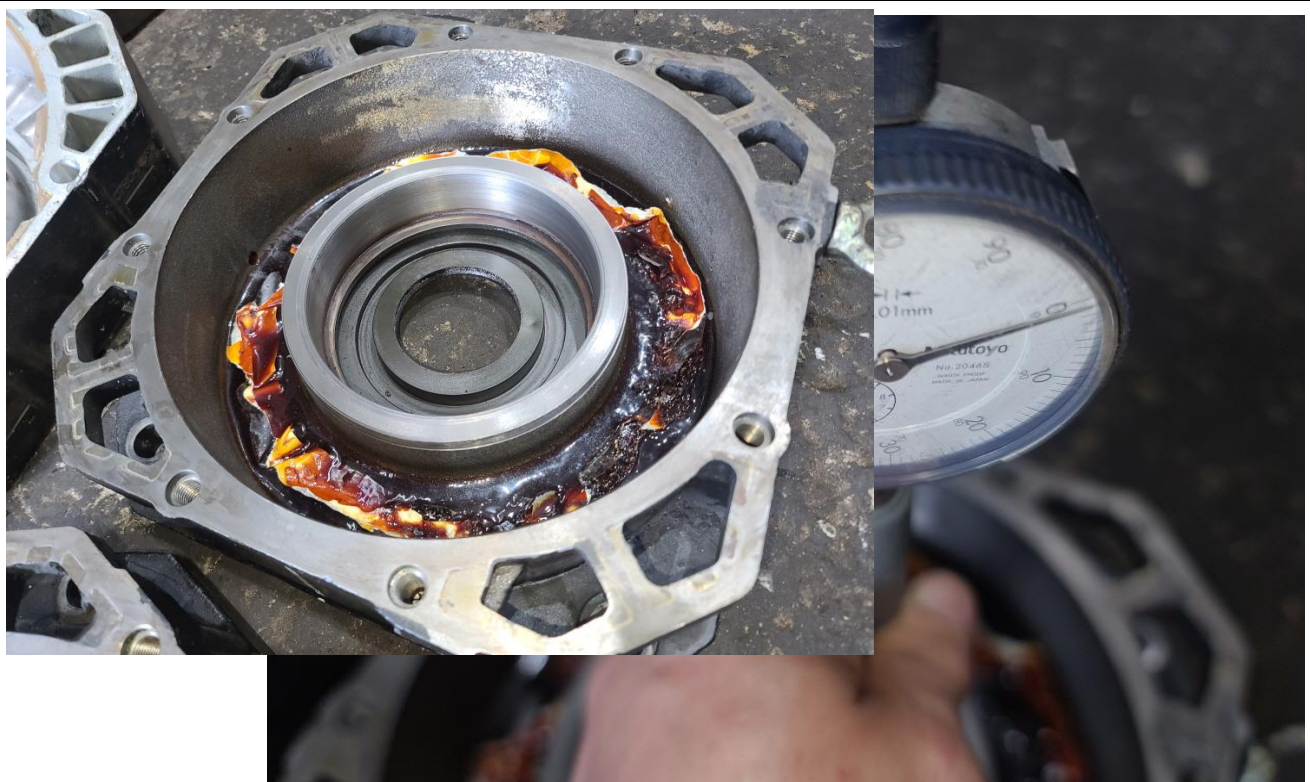


∞ 40 부하 측

HOUSING보수 후 검사

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC SERVO MOTOR OVERHAUL




∞ 40 반 부하 측	HOUSING보수 후 검사
작업공정	AC SERVO MOTOR OVERHAUL

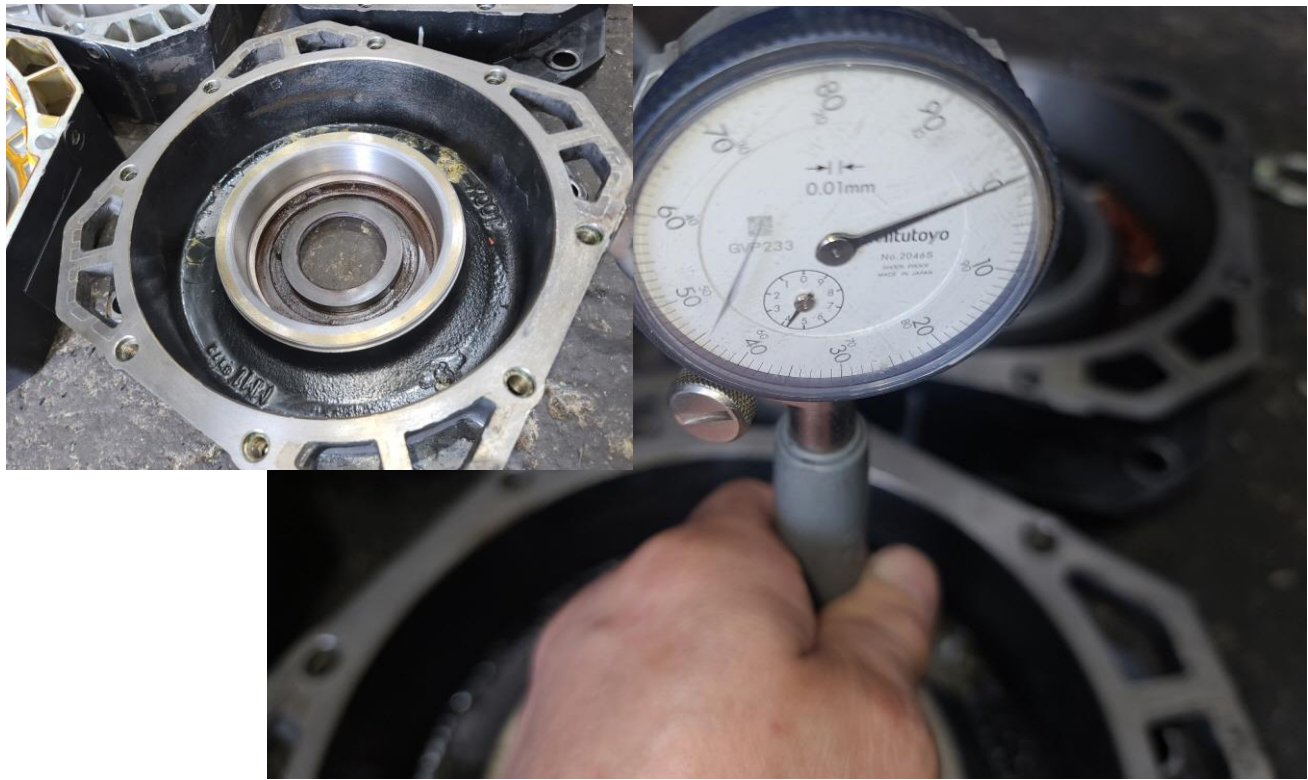

∞ 30 부하 측	HOUSING보수 후 검사
-----------	----------------

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC SERVO MOTOR OVERHAUL

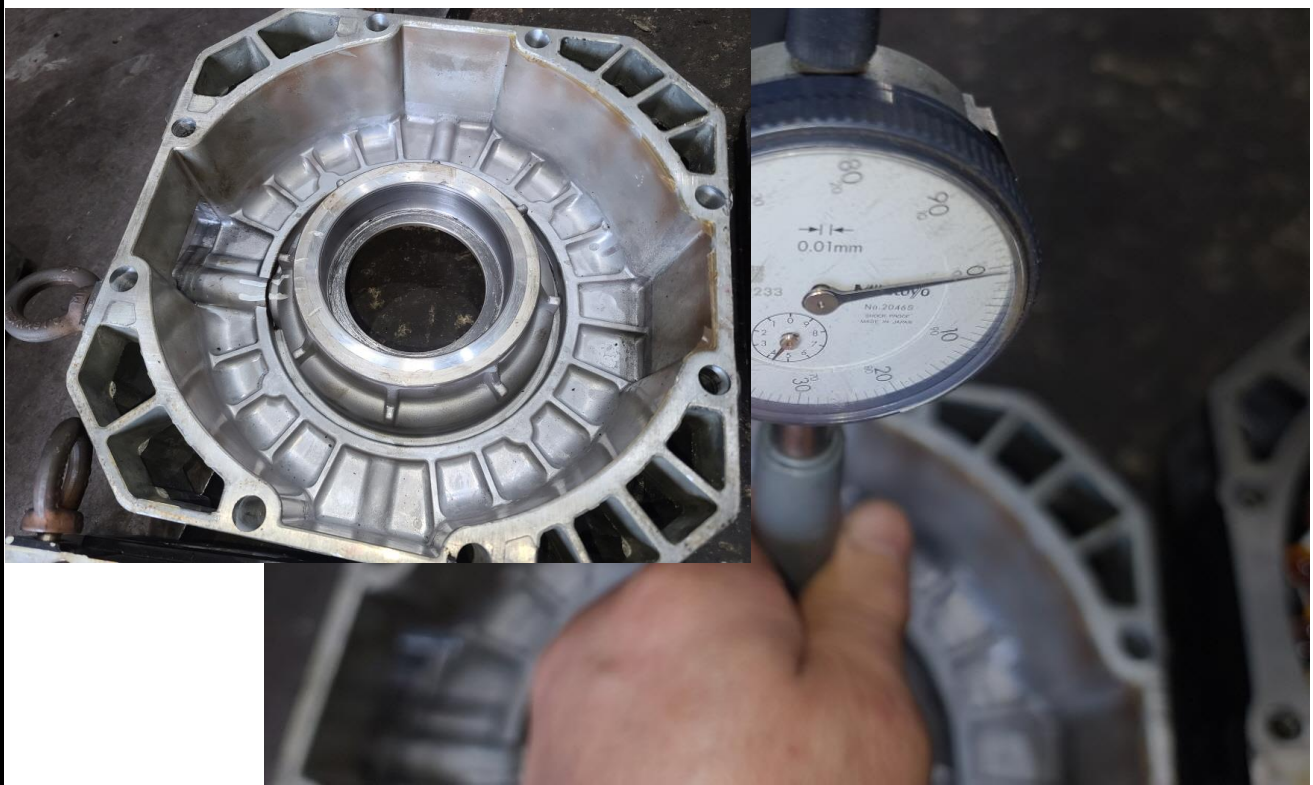

∞ 30 반 부하 측	HOUSING보수 후 검사
작업공정	AC SERVO MOTOR OVERHAUL



FAN MOTOR	BEARING교환 실시
-----------	--------------

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO MOTOR OVERHAUL

∞ 40



∞ 30

FAN MOTOR

보수 후 권선 검사

작업공정

AC SERVO MOTOR OVERHAUL



FAN MOTOR

시운전 TEST실시 (3회감아 실 CURRENT 220V/약0.23A)

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO MOTOR OVERHAUL




소모품

BEARING 예열 실시

작업공정

AC SERVO MOTOR OVERHAUL

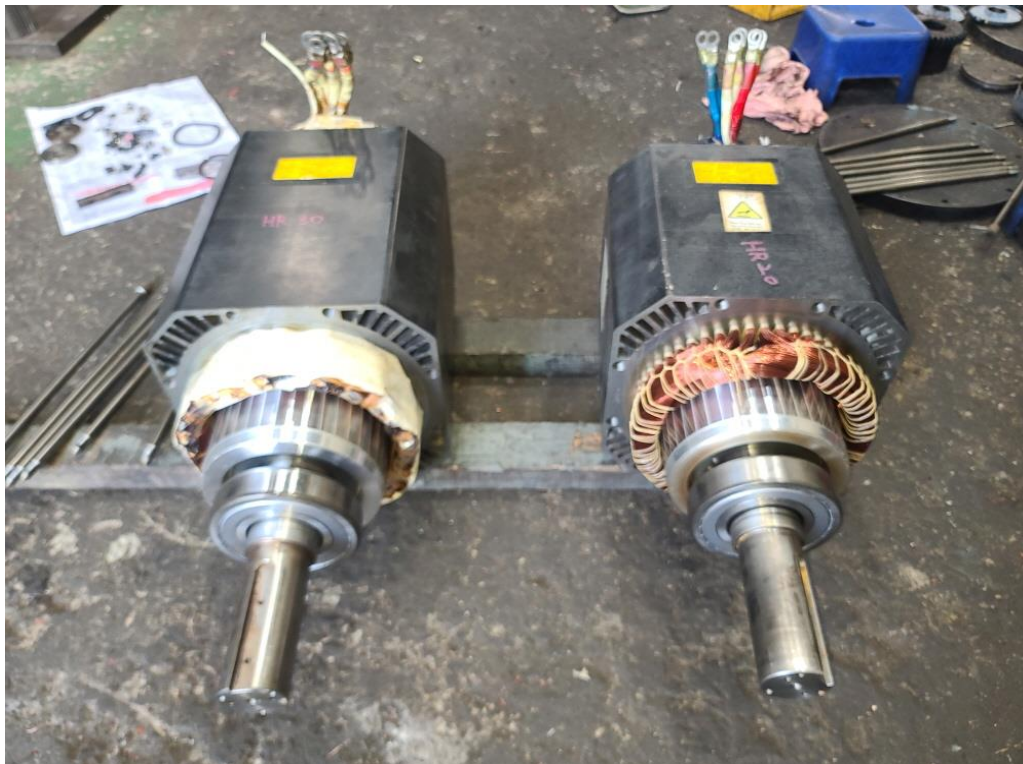

소모품

BEARING 예열삽입 조립실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO MOTOR OVERHAUL





∞40 출고 검사

절연저항 & 각 상별 권선저항

작업공정

AC SERVO MOTOR OVERHAUL

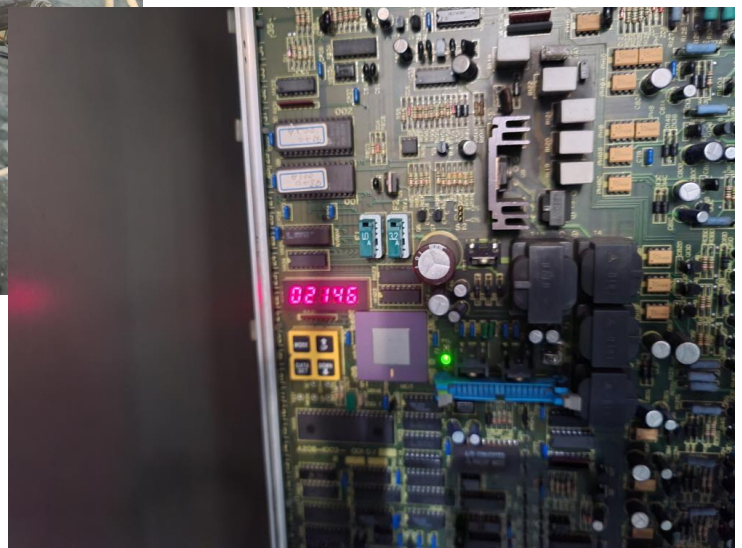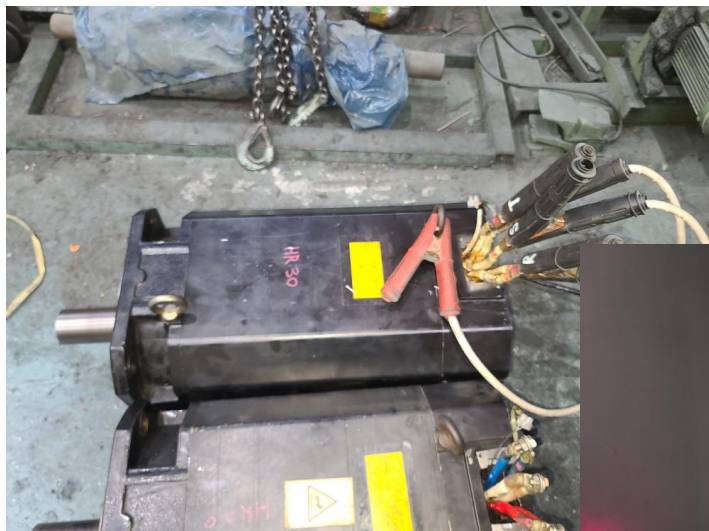

∞40 출고 검사

시운전 TEST 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC SERVO MOTOR OVERHAUL




∞ 30 출고 검사

절연저항 & 각 상별 권선저항

작업공정

AC SERVO MOTOR OVERHAUL

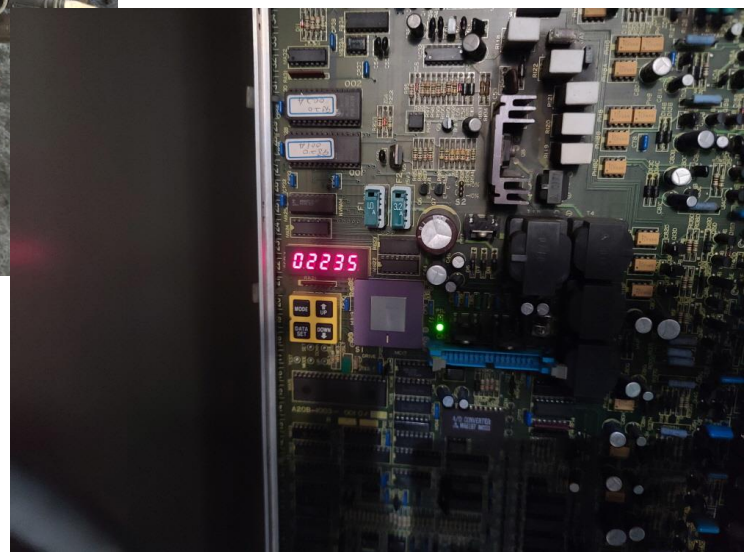

∞ 30 출고 검사

시운전 TEST 실시
