

# 작업공정사진철

고객명: 코린 주식회사  
공사명: ADP CRANE MOTOR수리

규격: BOOM HOIST MOTOR 50Hz 132KW 1488(1/min)

REPAIR 내역: (1)외부스팀세척  
(2)BEARING(일산) 부하/반부하  
(3)시운전TEST 및 REPORT작성  
(4)COLOR PAINTING  
(5)NAMEPLATE 교환  
(6)ROTOR BALANCING



<http://jinyangmotor.com/>

**KmR**  
ISO 9001



JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

BOOM HOIST MOTOR 50Hz 132KW 1488(1/min) 점검



Ass'y

분해 실시

작업공정

BOOM HOIST MOTOR 50Hz 132KW 1488(1/min) 점검



ROTOR

BALANCING 실시 및 UNBALANCE 교정

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	BOOM HOIST MOTOR 50Hz 132KW 1488(1/min) 점검
 <p>The top-left image shows two NTN bearings in their original packaging, with a timestamp of 2018/09/11 07:58 AM. The top-right image shows a close-up of a bearing being installed onto a shaft, with a timestamp of 2018/09/11 08:04 AM.</p>	
BEARING	예열 실시
작업공정	BOOM HOIST MOTOR 50Hz 132KW 1488(1/min) 점검
 <p>The bottom-left image shows a rotor assembly, with a timestamp of 2018/09/11 08:18. The bottom-right image shows a close-up of grease being applied to a bearing, with a timestamp of 2018/09/11 09:11 AM.</p>	
ROTOR	BEARING예열삽입 실시 GREASE CHARGING

JIN YANG

# 작업 공정 사진

작업공정

BOOM HOIST MOTOR 50Hz 132KW 1488(1/min) 점검



Ass'y

조립 실시

작업공정

BOOM HOIST MOTOR 50Hz 132KW 1488(1/min) 점검



출고검사


절연저항 & 각 상별 권선저항

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

BOOM HOIST MOTOR 50Hz 132KW 1488(1/min) 점검

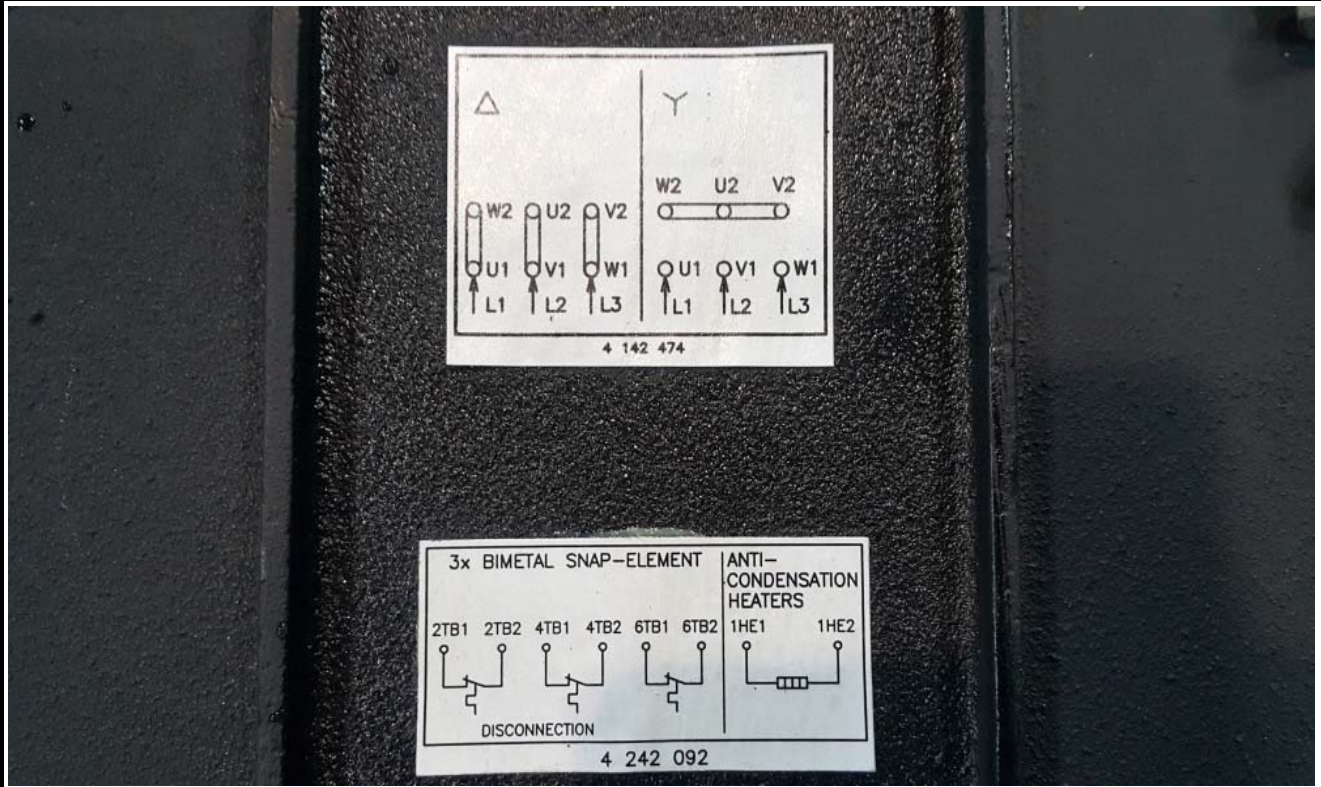

출고검사

POWER 및 SIGNAL SENSOR LINE

작업공정

BOOM HOIST MOTOR 50Hz 132KW 1488(1/min) 점검



출고검사

시운전 TEST 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

BOOM HOIST MOTOR 50Hz 132KW 1488(1/min) 점검



출고검사

△시 시운전 TEST 운전 CURRENT

작업공정

BOOM HOIST MOTOR 50Hz 132KW 1488(1/min) 점검



Ass'y

출고검사 후 COLOR PAINTING

