

작업공정사진철

고객명: (주)

공사명: 터빈공장 100톤 OHC(TE96) 보권MOTOR

규격: 권선형 440V 37KW 6P(ED40%)

REPAIR 내역: 분해 조립 및 불순물 CLEANSING DRYING
1차, 2차 RECONDITION
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
DRUM측 SHAFT METALLIZING 연마
BEARING 교환
입 출고검사 시운전 TEST



<http://jinyangmotor.com/>

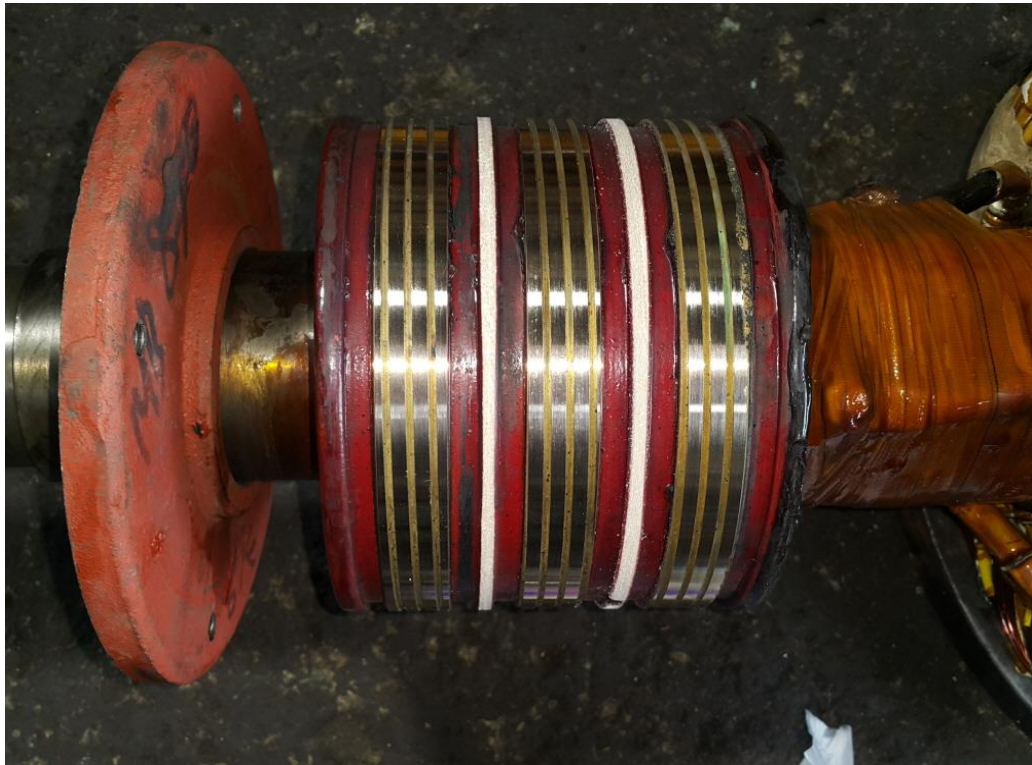


JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	권선형 MOTOR 37KW 6P 입고검사
	
Ass'y	분해 전
작업공정	권선형 MOTOR 37KW 6P 입고검사
1차   2차  	
1, 2차 권선검사	절연저항 및 각 상별 권선저항 동일

JIN YANG	작업 공정 사진	
작업공정	권선형 MOTOR 37KW 6P 입고검사	
		
DRUM 측	SHAFT 마모	
작업공정	권선형 MOTOR 37KW 6P 입고검사	
		
권체	분해 후	

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	권선형 MOTOR 37KW 6P RECONDITION
	
권체	세척 실시
작업공정	권선형 MOTOR 37KW 6P RECONDITION
	
조립부품	세척 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	권선형 MOTOR 37KW 6P RECONDITION
	
권체	세척 후 건조실시
작업공정	권선형 MOTOR 37KW 6P RECONDITION
	
DRUM 측	METALLIZING 연마 후 검사 60Φ 2/100

JIN YANG	작업 공정 사진	
작업공정	권선형 MOTOR 37KW 6P RECONDITION	
		
SLIP RING	동심도 가공	
작업공정	권선형 MOTOR 37KW 6P RECONDITION	
		
ROTOR	BEARING 예열교환 조립실시	

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	권선형 MOTOR 37KW 6P RECONDITION



출고검사	1차 절연저항 & 각 상별 권선저항
작업공정	권선형 MOTOR 37KW 6P RECONDITION



출고검사	2차 절연저항 & 각 상별 권선저항
------	---------------------

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	권선형 MOTOR 37KW 6P RECONDITION
	
출고검사	시운전 TEST 실시
작업공정	권선형 MOTOR 37KW 6P RECONDITION
	
출고검사	447V일때 2차 출력전압
