

작업공정사진철

고객명:

공사명: AC MOTOR REWINDING

규격: AC MOTOR 125KW 6P

REPAIR 내역: 분해 조립 및 조립부품 불순물 CLEANSING
STATOR REWINDING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
입 출고검사 시운전 TEST 및 COLOR PAINTING



<http://jinyangmotor.com/>

KmR
ISO 9001



JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 125KW 6P 입고검사



Ass'y

분해 전

작업공정

AC MOTOR 125KW 6P 입고검사



권체


이 MOTOR의 결선은 3本△이므로 1상이 결상일때 △의 권선소손 형태로
서 기동또는 운전CONTROLLER 이상이 짐작되고 점검이 꼭 필요한 것으로 판단됨

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 125KW 6P REWINDING

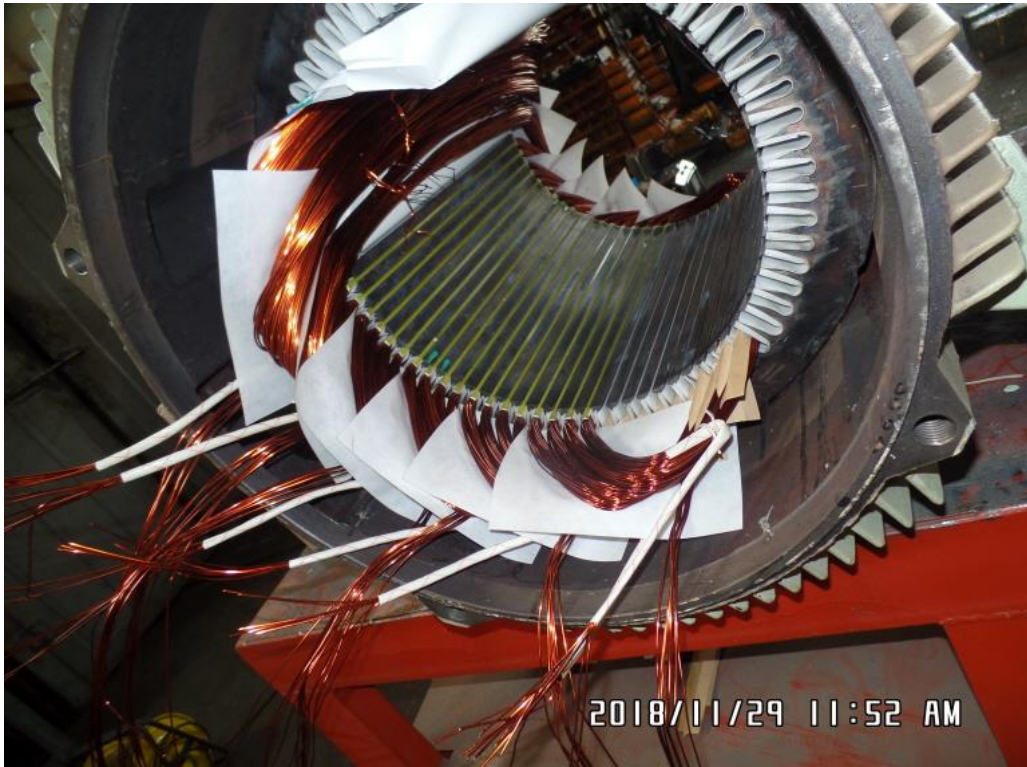

STATOR권체

재 권선 실시

작업공정

AC MOTOR 125KW 6P REWINDING



STATOR권체


재 권선 실시 완료

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 125KW 6P REWINDING

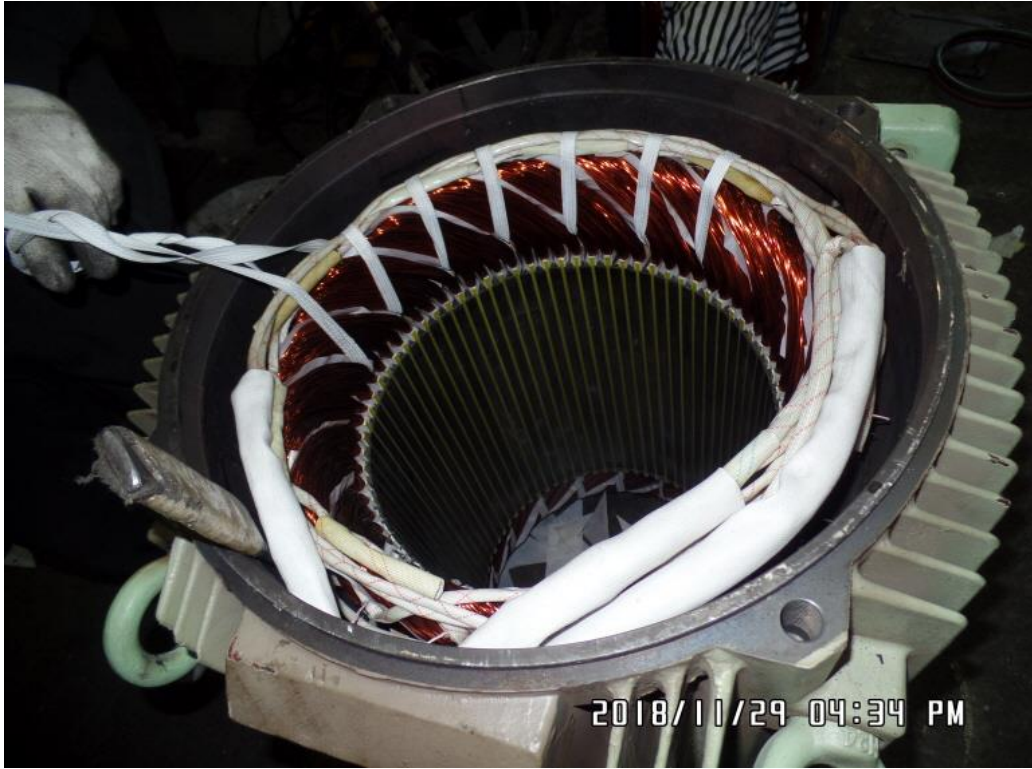

STATOR권체

결선 후 BANDING실시


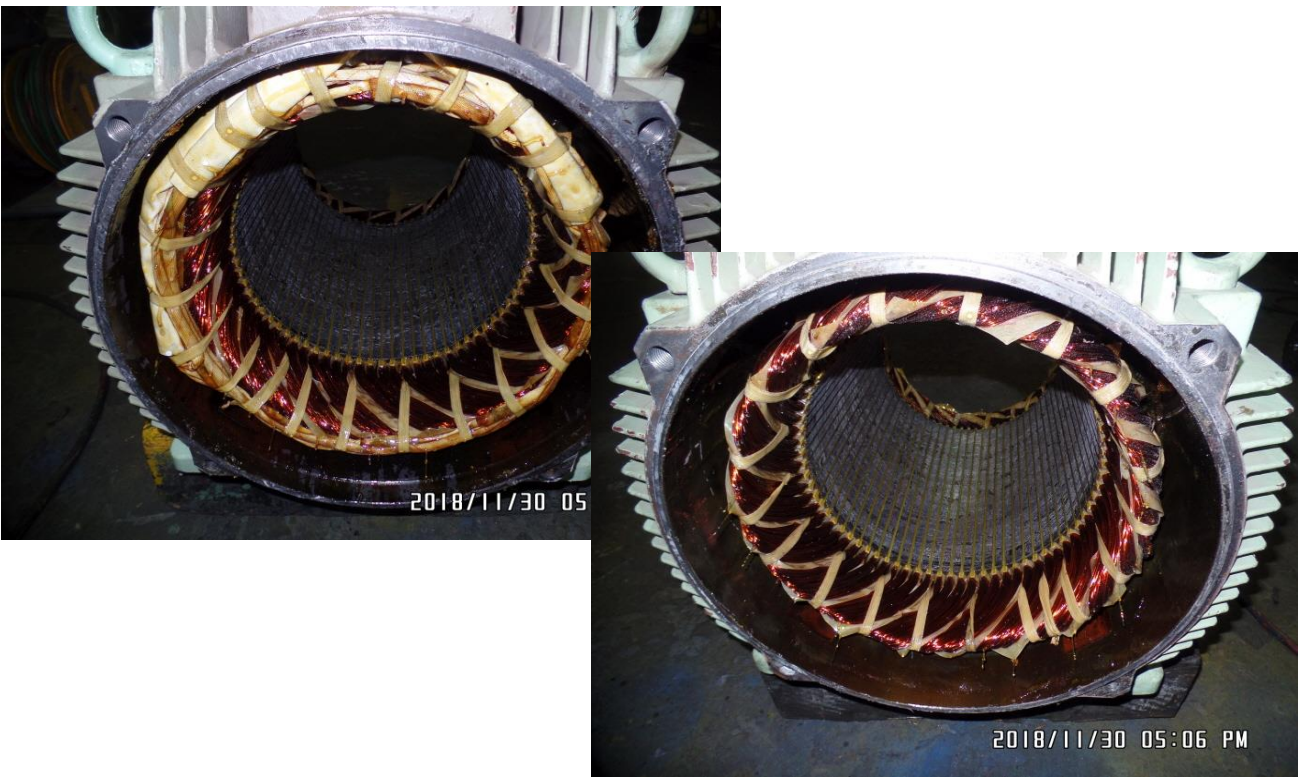
작업공정

AC MOTOR 125KW 6P REWINDING



STATOR권체

1차 INSULATING VARNISH DIPPING DRYING실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 125KW 6P REWINDING
	
STATOR권체	2차 INSULATING VARNISH DIPPING DRYING실시
작업공정	AC MOTOR 125KW 6P REWINDING
	
STATOR권체	절연건조 완료 후

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 125KW 6P REWINDING



출고검사

절연저항 & 각 상별 권선저항

작업공정

AC MOTOR 125KW 6P REWINDING



출고검사

시운전 TEST 실시

JIN YANG

작업 공정 사진

작업공정

AC MOTOR 125KW 6P REWINDING



출고검사

시운전 TEST 운전 CURRENT

작업공정

AC MOTOR 125KW 6P REWINDING



Ass'y

출고검사 후

