입 출고검사 공정 사진철

고 객 명: (주)
공 사 명: PRESS MOTOR REWINDING

규 격: AC MOTOR 60HP 4P 220V

REPAIR 내역: 분해 조립 및 조립부품 불순물 CLEANSING
STATOR REWINDING
INSULATING VARNISH DIPPING DRYING
BEARING 교환
입 출고검사 시운전 TEST


진양전기

http://jinyangmotor.com/

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 60HP 4P 입고검사



Ass'y	분해 전
작업공정	AC MOTOR 60HP 4P 입고검사

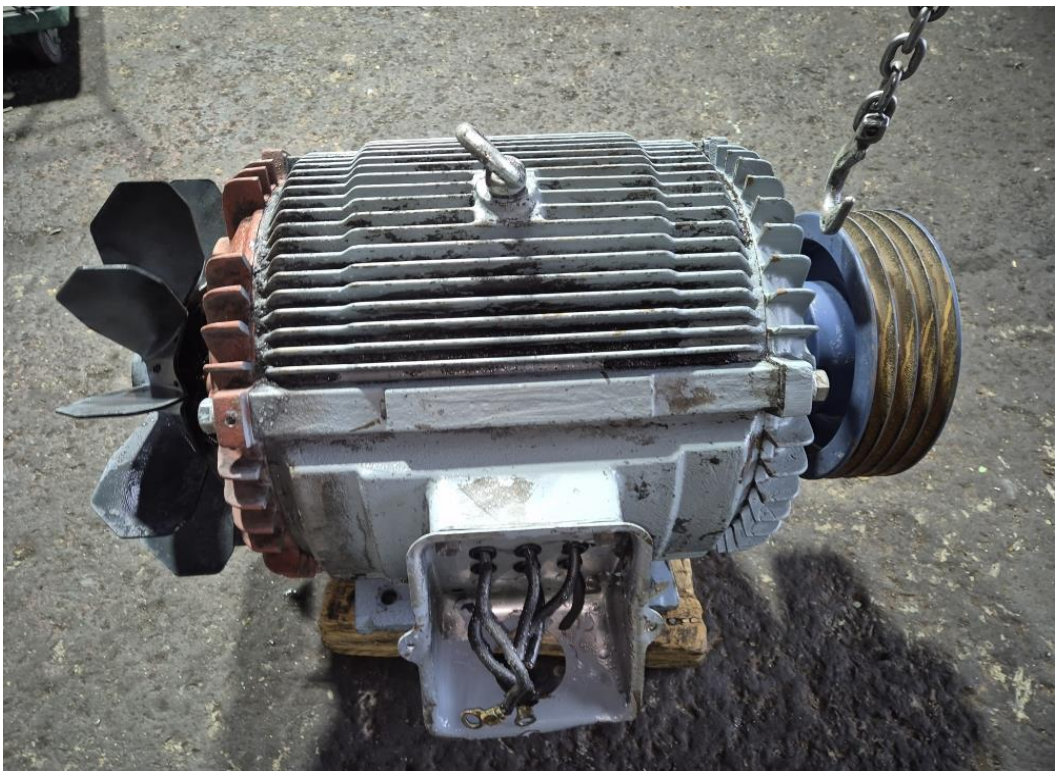


Ass'y	세척 후 분해 실시

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 60HP 4P 입고검사



STATOR 권체	과부하 소손으로 판단되고 원인 분석후 필요한 조치가 있어야 할 것으로 보임
작업공정	AC MOTOR 60HP 4P REWINDING

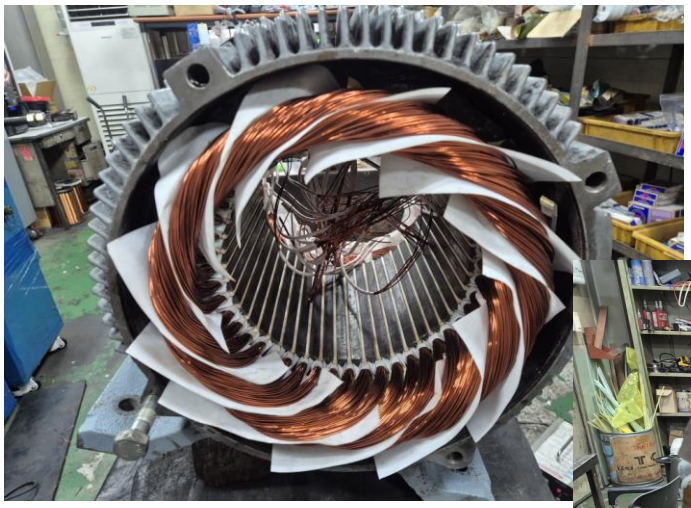




STATOR 권체	재 권선 실시


JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 60HP 4P REWINDING



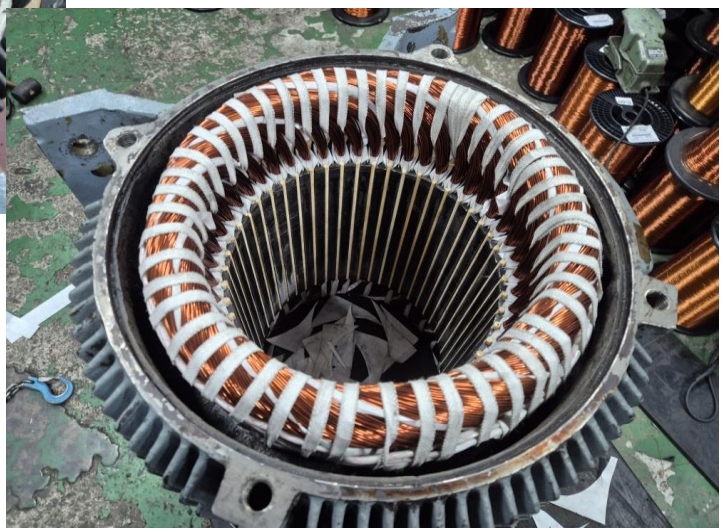

STATOR 권체	결선 및 BANDING 실시
작업공정	AC MOTOR 60HP 4P REWINDING



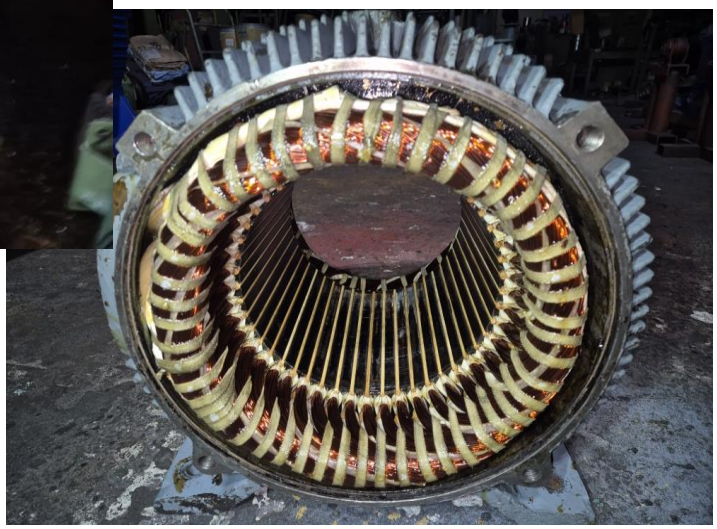

STATOR 권체	INSULATING VARNISH DIPPING DRYING 실시 후

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 60HP 4P REWINDING








ROTOR	BEARING 예열교환 조립실시
작업공정	AC MOTOR 60HP 4P REWINDING




출고검사	△일때 각 상별 절연저항 & 권선저항

JIN YANG	작업 공정 사진
작업공정	AC MOTOR 60HP 4P REWINDING

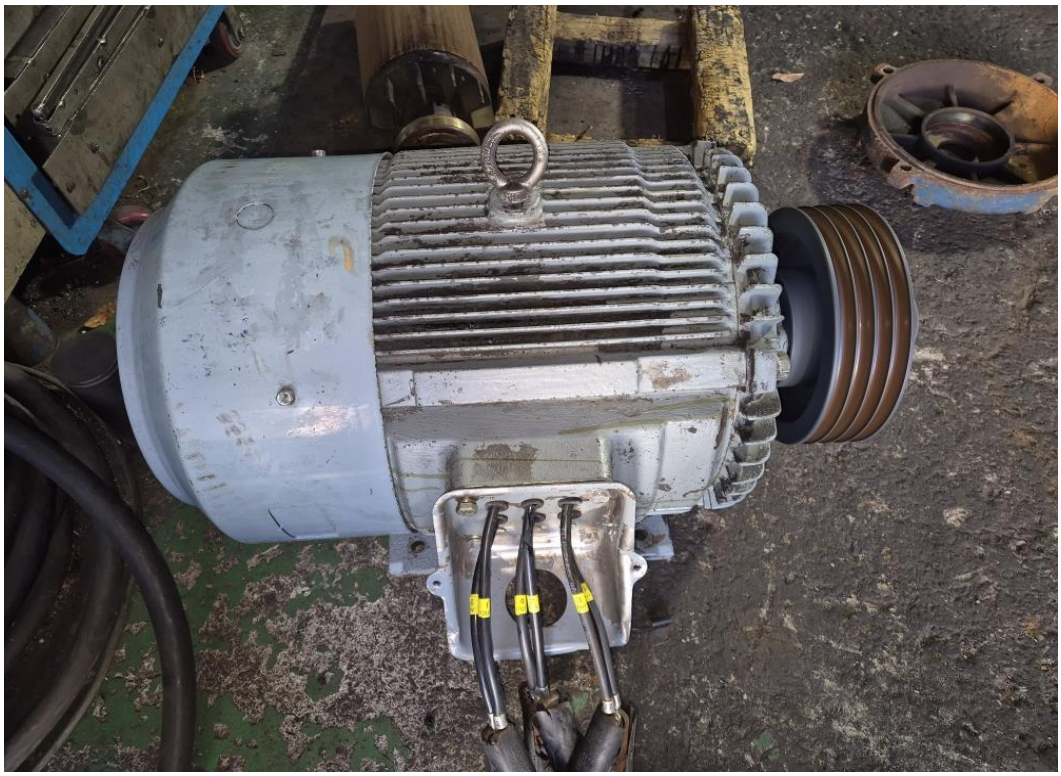

출고검사	시운전 TEST 실시
작업공정	AC MOTOR 60HP 4P REWINDING

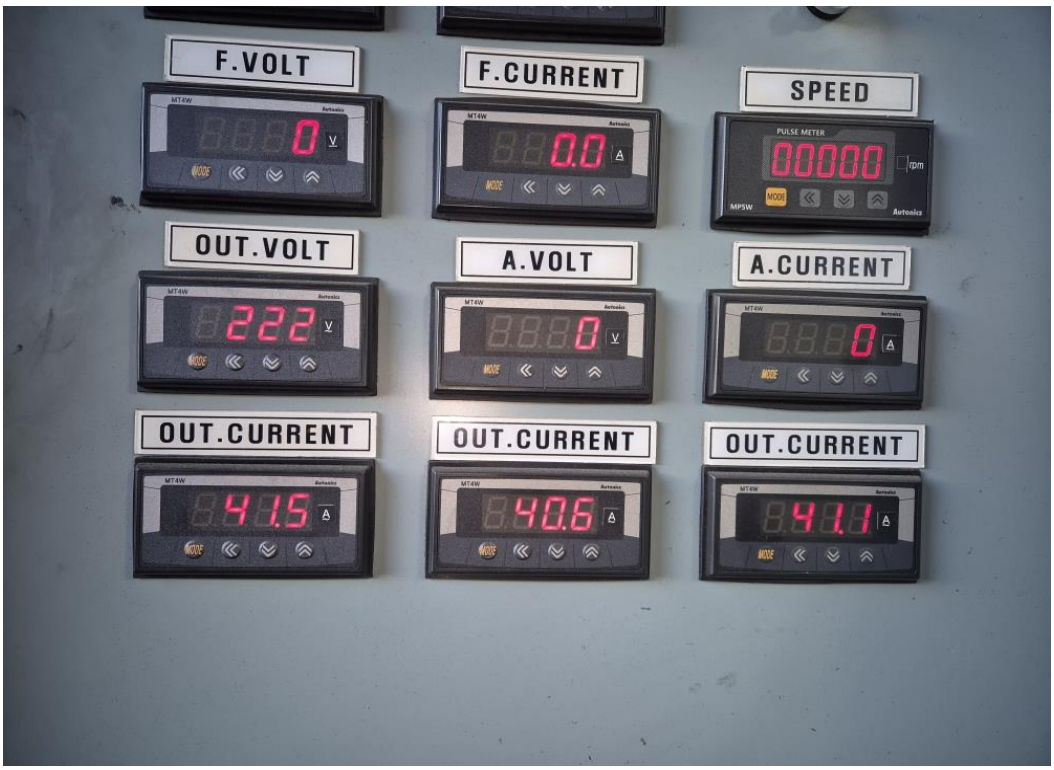

출고검사	시운전 TEST 실시 △일때 운전 CURRENT
